TIJDSLIJN

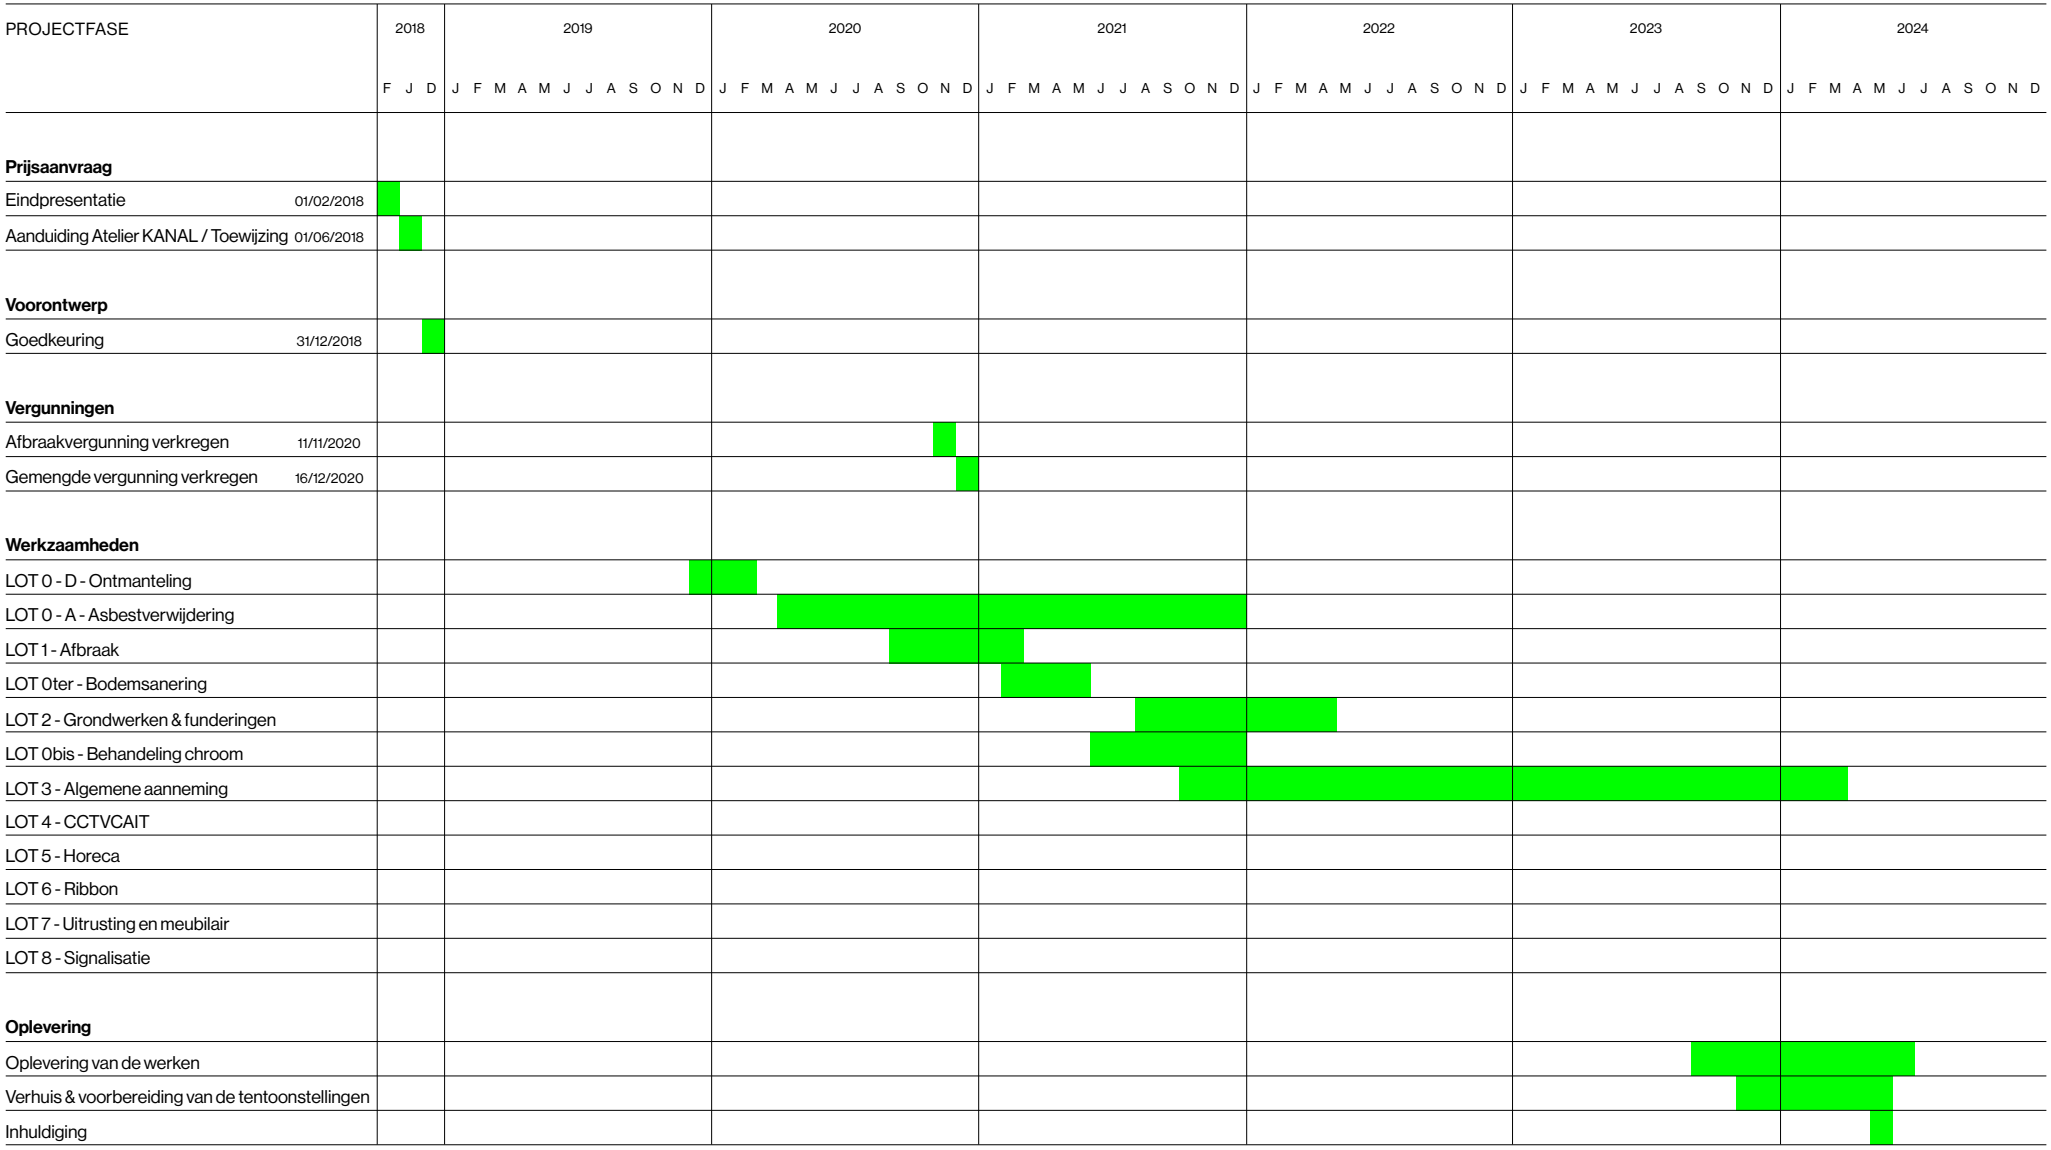
PROJECTFASE
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
F J D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Prijsaanvraag
Eindpresentatie 01/02/2018
Aanduiding Atelier KANAL / Toewijzing 01/06/2018
Voorontwerp
Goedkeuring 31/12/2018
Vergunningen
Afbraakvergunning verkregen 11/11/2020
Gemengde vergunning verkregen 16/12/2020
Werkzaamheden
LOT 0 - D - Ontmanteling
LOT 0 - A - Asbestverwijdering
LOT 1 - Afbraak
LOT 0ter - Bodemsanering
LOT 2 - Grondwerken & funderingen
LOT 0bis - Behandeling chroom
LOT 3 - Algemene aanneming
LOT 4 - CCTVCAIT
LOT 5 - Horeca
LOT 6 - Ribbon
LOT 7 - Uitrusting en meubilair
LOT 8 - Signalisatie
Oplevering
Oplevering van de werken
Verhuis & voorbereiding van de tentoonstellingen
Inhuldiging
